


Intervention de l'ONAS dans la ville de Meknassi

Problématique : déversement des eaux usées au niveau de la route menant à Sidi Bouzid



Problématique : déversement des eaux usées passant par la route adjacente à la cité des Agents du Ministère de l'Education jusqu'au jardin public.

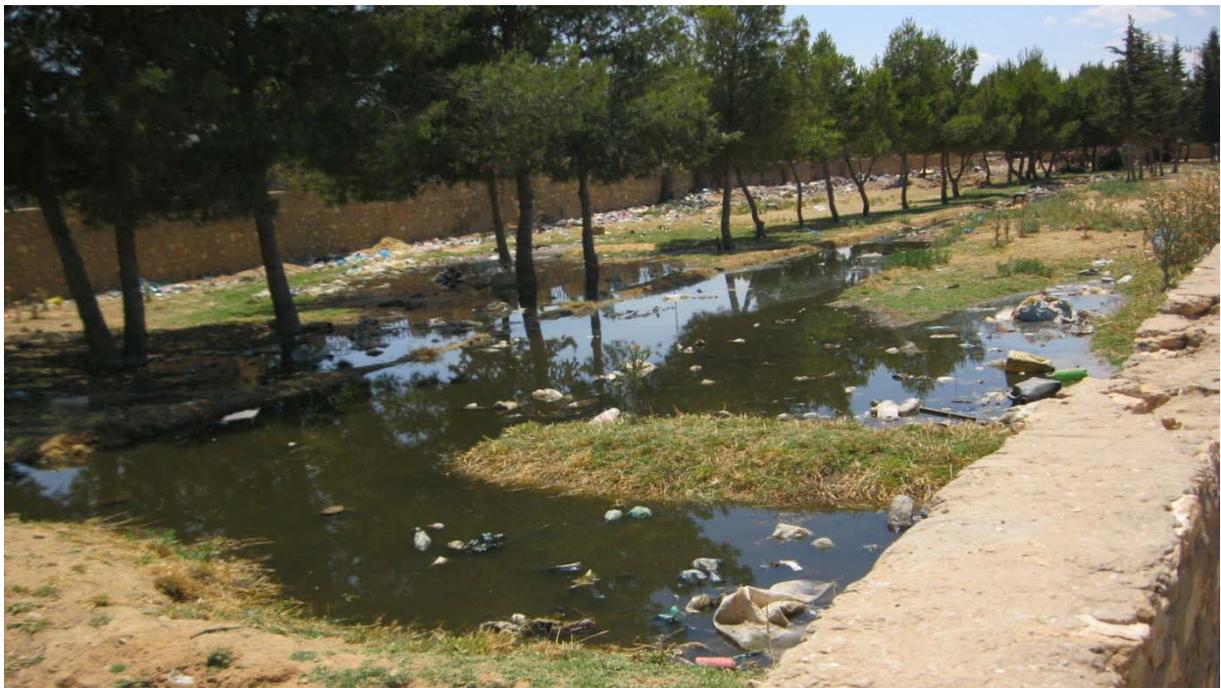

Les mesures prises : intervention urgente : fourniture de :

- 2 hydrocureuses intégrées pour le curage et levée des bouchons
- une aspiratrice géante et une hydrocureuse intégrée , pour une durée 4 jours pour le curage du réseau public d'assainissement .



Démarrage des travaux de curage du réseau de la ville de Meknassi le 15 juin 2015 pour une durée de 45 jours.



Réparation de la conduite sous la voie ferrée pour les travaux de fonçage



Les mesures prises :

- Reprise de branchement des logements qui sont contre bas par rapport à la chaussée,
- une deuxième opération de fonçage sous la voie ferrée,
- la pose de 1 km de conduite et la reprise de branchement de 40 logements. Travaux délégués à une entreprise privée et l'achèvement des travaux est prévu pour la fin du mois de juillet 2015.



Réhabilitation des conduites :

L'ONAS a procédé à la levée topographique et l'élaboration d'une étude et ce, pour remédier à la problématique causée par le déversement des eaux près de la salle couverte.

Les mesures prises :

Réhabilitation de 2 km des conduites, diamètre 315 mm

Un dossier d'appel d'offres a été élaboré et le démarrage des travaux est prévu pour le mois d'octobre 2015 et son achèvement est pour le mois de février 2016.

Problématique : la mise en exploitation de la station d'épuration à été bloquée à cause de l'opposition des habitants sur la trajectoire de la conduite de transfert des eaux usées traitées vers oued Elben.
